



จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๙๒.๖๐ %
 สรุปลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๗.๔๐ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานพื้นสะพานบนคานคอนกรีตอัดแรง (แล้วเสร็จ)
- ❖ ดำเนินงานราวสะพานด้านข้าง และ กลาง (แล้วเสร็จ)
- ❖ ดำเนินงานติดตั้ง Expansion Joint (Free End) (แล้วเสร็จ)
- ❖ ดำเนินงานลงวัสดุชั้นทางในจุดต่างๆ
- ❖ ดำเนินงานติดตั้งกำแพงกันเสียง (ช่วงต้นโครงการ)
- ❖ ดำเนินการติดตั้ง ไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ผู้รับจ้าง	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
ค่าก่อสร้าง	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วันเริ่มต้นสัญญา	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
	๑,๔๖๐ วัน

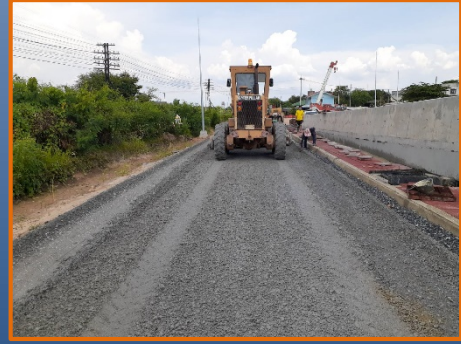

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
